

Bautagebuch der Gerätehauserweiterung

1. Beginn des Gerätehaus-Anbau 10. Juni 2014

Beginn des geplanten Gerätehaus-Anbau

Am Dienstag, den 10. Juni 2014, wurden erste vorbereitende Arbeiten erledigt.

Gegen 18:00 Uhr trafen sich etwa fünfzehn Kameraden, um gemeinsam die für einen Gerätehaus-Anbau hinderlich liegenden Pflastersteine zu entfernen. Im Vorfeld fällten drei Kameraden einen ebenfalls störenden Ahorn und transportierten den Grünschnitt zu einem dafür genehmigten Ablageort.

Sobald die Unterlagen für die Baustatik vorliegen, beginnen die Ausschachtungsarbeiten für den Gebäudesockel.



2. Grabarbeiten für die Gasleitung 27. Juni 2014

Zweiter Arbeitsschritt Grabarbeiten

Am Freitag, den 27. Juni 2014, folgte der zweite Arbeitsschritt beginnend mit der Entfernung des bereits in den Vorbereitungsarbeiten gefälltten Baumes. Daraufhin wurden erste Grabarbeiten für die Verlegung der Gasleitung durchgeführt.



3. Verlegung wichtiger Leitungen 01. Juli 2014

Verlegung von Gas- u. Wasserleitung

Am Dienstag, den 01. Juni 2014, wurde ein weiterer, hinderlich liegender Baum gefällt und beide Baumstümpfe beseitigt. Nachfolgend begann man mit der Verlegung von Gas- sowie der Wasserleitung. Nachdem diese Arbeiten erledigt waren, konnte man bereits mit Vorbereitungsarbeiten für das Fundament beginnen.



4. Gießen des Fundamentes 17. Juli 2014

Fundament wurde mit Beton gegossen

Am Mittwoch, den 16. Juli 2014, wurde der Fundamentgraben mittels Betonmischfahrzeug ausgegossen. Im Folgenden kann das Fundament ausgehoben werden.



5. Bewehrung 23. Juli 2014

Bewehrung für Bodenplatte fertiggestellt

Am Mittwoch, den 23. Juli 2014, wurde der vom Streifenfundament umschlossene Mutterboden ausgeschachtet, um die Aufschüttung mit Schotter zu ermöglichen. Daraufhin wurde der Schotter mittels Rüttelplatte verdichtet. Im Anschluss erfolgte das Verlegen der PE-Folie, die den Sinn verfolgt, die Bodenplatte gegen Feuchtigkeit abzudichten.


Im letzten Arbeitsschritt wurde die doppelte Bewehrung verlegt. In den folgenden Tagen können die Arbeiten für die Bodenplatte abgeschlossen werden.



6. Bodenplatte 25. Juli 2014

Arbeiten an der Bodenplatte abgeschlossen

Am Freitag, den 25. Juli 2014, wurde die Bodenplatte mittels Betonmischfahrzeug betoniert und gleichmäßig, eben verteilt. Nachdem der Beton angetrocknet war, wurde der Oberfläche geglättet. Hierzu wurde ein Flügelglätter verwendet. Damit ist die Bodenplatte fertig gestellt und der eigentliche Rohbau kann beginnen. Im Laufe der Woche wurden bereits 23 Paletten Bausteine und weiteres Baumaterial geliefert.

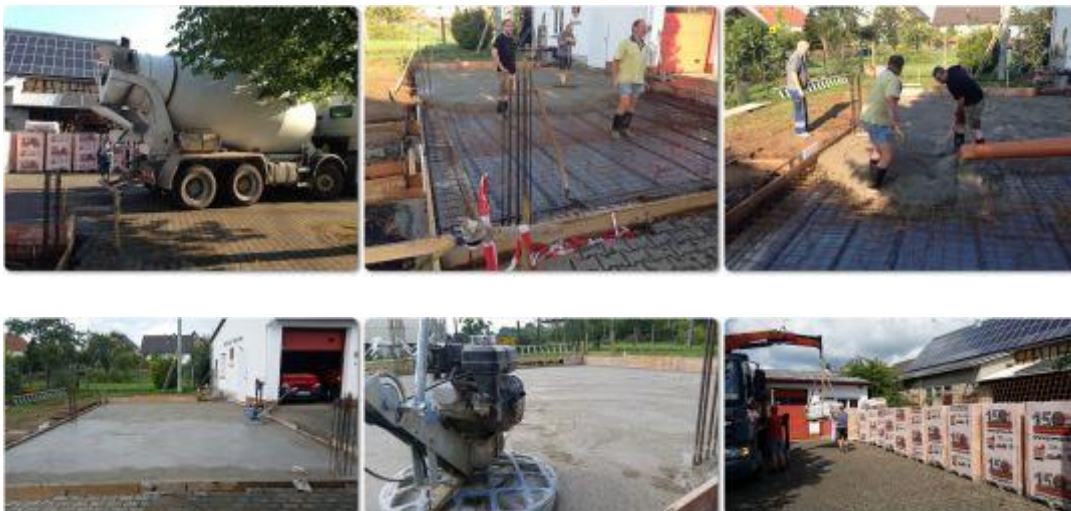

7. Beginn Rohbau 29. Juli 2014

Beginn des Rohbaus

Am Dienstag, den 29. Juli 2014, konnten die Mauerarbeiten begonnen werden. In den folgenden Arbeitseinsätzen wird der Rohbau des Anbaus fertig gestellt.



8. Rohbau Erdgeschoss 02. & 05 August 2014

Rohbau macht Fortschritte

Am Samstag, den 02. August 2014 und am Dienstag, den 05. August 2014, sorgten viele helfende Hände für schnell verlaufende Mauerarbeiten. Als Resultat des Arbeitseinsatzes ging eine fast fertiggestellte Ummauerung des vier Meter hohen Erdgeschosses hervor. Lediglich vier Lagen der Bausteine werden für den Abschluss des Erdgeschosses benötigt.

Die erste Decke wird voraussichtlich am 01. September 2014 geliefert.





9. Fertigstellung des Türsturzes 09. August 2014

Weiterer Arbeitseinsatz

Am Samstag, den 09. August 2014, trafen sich wiederholt viele Helfer, um den Türsturz fertigzustellen. Ebenfalls wurde mit der Einschalung des Ringbalkens und der Anfertigung zweier Bewehrungen für die Aussteifungsstützen begonnen.



10. Vorbereitungen für Deckenplatte 26. August 2014

Letzte Arbeiten vor Einsatz der Deckenplatte

Am Dienstag, den 26. August 2014, wurden die Ringanker teilweise betoniert. Ebenfalls fanden weitere Einschalungsarbeiten statt. Anfang September wird die Deckenplatte erwartet. Herzlich bedanken möchten wir uns bei unserem Landrat Frank Puchtler. Dieser spendierte allen anwesenden Helfern leckeres Eis im Wert von 20 Euro.



11. Die Deckenplatte kann kommen 06. September 2014

Alles bereit für die Deckenplatte

Am Samstag, den 06. September 2014, trafen wieder viele Helfer ein, um die letzten Arbeiten vor der Lieferung der Deckenplatte fertigzustellen. So wurden unter anderem die letzte Schicht Steine gesetzt und die Ringanker verschalt sowie betoniert. Ebenfalls konnte die Verschalung für den Torsturz fertig gestellt werden. Nun kann die Deckenplatte fristgerecht verbaut werden.



12. Lieferung der Deckenplatte 22. September 2014

Lieferung der Deckenplatte und der Treppenteile

Am Montag, den 22. September 2014, wurde die Deckenplatte sowie die Treppenteile geliefert. Mittels Kranwagen wurden die Teile der Deckenplatte in die korrekte Position gebracht. Im Folgenden wurden die Treppenteile an ihre vorgegebene Position gehoben und miteinander verbunden. Nun kann im nächsten Arbeitsschritt die Betonierung der Deckenplatte erfolgen.



13. Betonierung der Deckenplatte 26. September 2014

Betonierung der Deckenplatte und des Torsturzes

Am Freitag, den 26. September 2014, trafen sich erneut viele Helfer, um gemeinsam die Deckenplatte zu betonieren. Zwei Betonmischfahrzeuge beförderten 12 m³ Beton in das erste Obergeschoss. Der Beton wurde mittels Betonrüttler und Schieber gleichmäßig verteilt. Nun wird dem Beton eine Ruhezeit von acht Tagen gewährt, um komplett auszuhärten.



14. Mauerarbeiten 1. O.G. 11. Oktober 2014

Mauerarbeiten erstes Obergeschoss

Am Samstag, den 11. Oktober 2014, halfen erneut viele helfende Hände, um die Mauerarbeiten für das erste Obergeschoss abzuschließen. In der vergangenen Woche wurden bereits Mauerarbeiten sowie die Vorfertigung der Ringanker durchgeführt. Im Folgenden werden alle Stürze, Stützen und der Ringanker betoniert.



15. Betonierung Ringanker 18. Oktober 2014

Mauerarbeiten am 2. Obergeschoss abgeschlossen

Am Samstag, den 18. Oktober 2014, trafen sich bereit um 08:30 Uhr viele Helfer, um gemeinsam den Ringanker zu betonieren. In der vergangenen Woche fanden bereits die Einschaltungsarbeiten für den Ringanker statt. Zudem wurde mit der Zimmerung des Dachstuhles begonnen. Am folgenden Samstag kann mit dem Aufschlagen des Dachstuhles begonnen werden.



16. Aufschlagen des Dachstuhles 25. Oktober 2014

Das Richtfest kann kommen !

Nachdem der Dachstuhl am vergangenen Samstag komplett gezimmert wurde, konnten viele Helfer am Samstag, den 25. Oktober 2014, mit dem Aufschlagen des Dachstuhles beginnen. Zuerst wurden die Deckenbalken mit Hilfe eines Gabelstaplers an ihre korrekten Positionen gebracht. Daraufhin folgten die Pfetten und der First. Im Folgenden konnten die einzelnen Sparren aufgelegt und verschraubt werden. Nach etwa sieben Stunden wurde der geschmückte Baum am Dachfirst angebracht. Der Bauleiter Manfred Klamp zerbrach nach seinem Richtspruch ein Weinglas, was als gutes Omen angesehen werden darf.



17. Bedachung 03. Dezember 2014

Bedachung durch Firma Ochs abgeschlossen

Am Mittwoch, den 19. November 2014, brachte die Bedachungsfirma Ochs aus Weisel bereits die Dachfolie auf. Das Trapezblechdach wurde dann am 03. Dezember 2014, mittels Kran in Position gebracht und befestigt. In den folgenden Wochen wird der Fenstereinbau folgen.



18. Einbau des Rolltores 07. Februar 2015

Einbau aller Fenster und des Rolltores

Am Samstag, den 07. Februar 2015, fand der Einbau des Rolltores statt. Wir bedanken uns recht herzlich für die Hilfestellung seitens Joachim Lauck. In den vergangenen Wochen wurde bereits das Gesims fertiggestellt, alle Fenster eingebaut und das Edelstahlgeländer befestigt.



19. Erdarbeiten und Sockelabdichtung 23. April 2015

Vorbereitungen für die Pflasterarbeiten

Am Donnerstag, den 23. April 2015, wurde der Grund mittels Bagger für die kommenden Pflasterarbeiten vorbereitet. Ebenfalls wurde der Sockel mit Reaktivabdichtung bestrichen, sodass keinerlei Feuchtigkeit eindringen kann. Abschließend wurde die Noppenfolie verlegt.



20. Beginn der Pflasterarbeiten 16. Mai 2015

Die ersten Pflastersteine werden verlegt

Am Samstag, den 16. Mai 2015, wurden die in der vergangenen Woche organisierten Randsteine fest mittels Beton verlegt. Diese gelten als Höhenorientierung für die kommenden Doppel T-Pflastersteine. Der Boden wurde mit Schotter und Split aufgefüllt, sodass die ersten Steine verlegt werden konnten.



21. Weitere Pflasterarbeiten 30. Mai 2015

Pflasterarbeiten schreiten voran

Am Samstag, den 30. Mai 2015, fanden erneut weitere Pflasterarbeiten statt. Etwa 8 qm² Schotter wurden aufgeschüttet, um die passende Höhe des Grundes zu erreichen. Daraufhin konnte der Split verteilt werden und mit dem Steinesetzen begonnen werden.



22. Innen- & Außenputz 23. Juli 2015

Gerätehaus nun von innen- und außen verputzt

In den vergangenen Wochen stellte die Firma Seifert aus Holzhausen erneut ein Gerüst auf und verputzte den Gerätehausanbau von innen und anschließend von außen. In den kommenden Wochen erfolgen ein zweiter Putz sowie der Anstrich.



23. Innen- & Außenanstrich August/September 2015

Außenanstrich und Hallenanstrich komplett

In den vergangenen Wochen erhielt das Gerätehaus seinen fertigen Außenanstrich. In der Fahrzeughalle wurden ebenfalls Anstrich, Elektrik und Beleuchtung fertiggestellt.

